

美濃加茂市新庁舎整備基本構想(概要版)

1. 新庁舎の役割・コンセプト・重点機能

ワークショップやアンケートの結果から、新庁舎の役割・コンセプト・重点機能を以下のとおり決定しました。

新庁舎の役割・コンセプトと重点機能の位置づけ

コンセプト

市民の安心な暮らしを守る
未来を見据えた新庁舎

役割

誰もが利用しやすく、
必要なサービスがスムーズに提供される

子どもや高齢者、外国籍の方、障がいのある
方など、どんな人でも受け入れられる

災害時の拠点として、
緊急時の対応ができる

業務効率の向上につながる
職場環境の充実

安心

未来

環境の変化に対応できる庁舎

平日に働く人も頼りやすい

申請等の手続きがオンラインでできる

行政機能をできる限り集中させた
建設費を抑えた庁舎

重点機能

- ・総合窓口
- ・受けられる支援や仕組みのわかりやすさ
- ・プライバシーの守られる相談ブース

- ・わかりやすい案内サインや動線

- ・災害対策

- ・情報セキュリティの強化
- ・会議室やミーティングスペースの充実

- ・フレキシブル(柔軟)に用途変更できる空間

- ・デジタルの申請・書類発行

- ・ワンフロアの相談窓口

2. 新庁舎の整備地

4つの候補地に対する可能性調査やタウンミーティング、アンケートの市民意見等から、新庁舎の整備地を「プラザちゅうたい敷地」に決定しました。プラザちゅうたいは老朽化が進んでいること等から、前平公園に移転する計画です。

整備のイメージ案



4つの候補地から
「プラザちゅうたい敷地」
に整備地決定

もっと知りたい方は...

『美濃加茂市新庁舎整備基本構想(本編)』をご覧ください。
<https://minokamochosha.jp/report/report-5766/>




3. 基本構想に係るこれまでの歩み ~検証から整備地の決定まで~

●新庁舎整備事業を見直すことを政策決定

●新庁舎整備事業プロジェクトチーム「情報整理部会」・「検証部会」にて検証
「旧計画がなぜ多くの市民との合意を形成することができなかったのか」を検証

7月 ●市民アンケート
これまでの進め方についての検証のため、市民の意見を把握

3月 ●新庁舎整備ロードマップを策定
これからの新庁舎整備の進め方についてのプロセスを提示



●令和5年度以降、おでかけワークショップを継続実施し、全24回・のべ900人以上が参加

7月 ●第1回市民ワークショップ(全3回)
テーマ:10年後の市の役割

9月 ●第2回市民ワークショップ(全3回)
テーマ:新庁舎の役割・新庁舎のコンセプト

11月 ●市民1,500人アンケート
新庁舎の役割・コンセプト等について市民全体の傾向を把握するため実施

12月 ●第3回市民ワークショップ(全3回)
テーマ:新庁舎の機能・複数候補地案

2月 ●市民4,000人アンケート
新庁舎の機能および複数候補地案について市民全体の傾向を把握するため実施



ご意見をお寄せいただきました全ての皆様に心より感謝申し上げます。
今後も新庁舎のコンセプト「市民の安心な暮らしを守る 未来を見据えた新庁舎」の実現に向けて、引き続き市民の皆様との対話を重ねながら新庁舎の整備を進めてまいります。



~R4年度 R5年度

R6年度

●可能性調査
4候補地における新庁舎整備の可能性調査を実施



7月・8月 ●子育て世代・障がい児者(養護者含む)・外国人市民の方を対象としたワークショップを開催

12月 ●タウンミーティング
テーマ:4候補地の情報共有



●職員アンケート
テーマ:新庁舎の整備地

2月 ●可能性調査結果、市民・職員意見等を総合的に判断し、市の方針として「プラザちゅうたい敷地」を整備地とすることを政策決定




3月 ●市議会で「プラザちゅうたい敷地」を整備地とする「美濃加茂市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例案」が否決
可決に必要な出席議員の3分の2以上の賛成を得られず否決

R7年度

9月 ●新庁舎整備事業説明会を実施

10月 ●市民8,000人アンケート
「プラザちゅうたい敷地」を新庁舎整備地とする市の方針に対し、市民の意見を精度高く把握するため実施

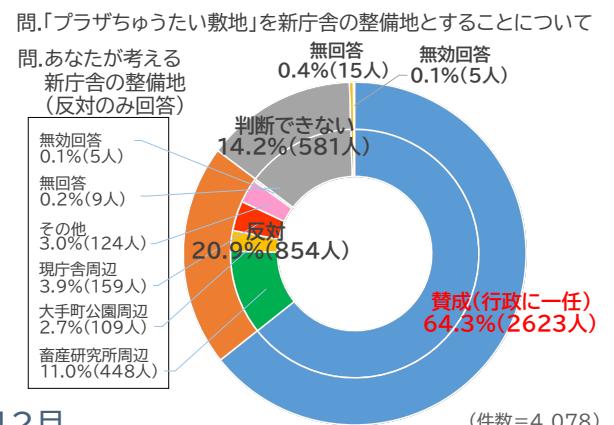

12月 ●新庁舎の整備地を「プラザちゅうたい敷地」に決定
市議会で『美濃加茂市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例案』が可決

3月 ●美濃加茂市新庁舎整備基本構想策定

4. 今後のスケジュール(案)

今後策定する基本計画において、導入機能(※)や建物配置、建物内部の空間構成、事業手法などの基本設計に向けた要件整理を進めていきます。新庁舎供用開始時期は令和13年度を想定しています。

※導入機能とは新庁舎に求められる機能の構成や考え方の全体像を示すものです。

	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度
計画・設計	基本計画	基本設計	実施設計				
庁舎建設					建築工事		
引越し						引越し	新庁舎供用開始
解体工事(現プラザちゅうたい)				解体・整地			

※従来の発注方式の場合の想定スケジュールです。事業手法やプラザちゅうたい・中央図書館・弓道場の計画によりスケジュールは異なるため、基本計画策定時に改めて公表します。なお、年度については目標年度であり、進捗状況により変更します。
